



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 13 - TRE/PRESI/DG/STI

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

| Data       |  | Horário |        | Local            | Coordenador da Reunião |
|------------|--|---------|--------|------------------|------------------------|
| 18/09/2025 |  | 11:30h  | 12:15h | Videoconferência | Leonardo Moraes        |

**PAUTA**

1. Acompanhamento das Iniciativas de Tecnologia da Informação
2. Monitoramento das Contratações de TI

**PARTICIPANTES**

| Nome                             | Unidade |
|----------------------------------|---------|
| Leonardo Moraes Júnior           | COELEI  |
| Paulo das Neves e Silva Júnior   | SEINF   |
| Etevaldo Cândido Custódio        | SEAU    |
| Leonardo Saraiva e Silva         | NSCIB   |
| Antônio Manoel Silveira de Sousa | NSEGI   |
| Ana Caroline Carvalho Portela    | GABSTI  |

**APRESENTAÇÃO**

| Discussão | Decisão / Pendência                                                                | Responsável     | Data Limite   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Abertura  | Recepcionados os presentes, o Secretário substituto apresentou a pauta da reunião. | Leonardo Moraes | Não se aplica |

| Discussão                                                  | Decisão / Pendência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável       | Data Limite   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Acompanhamento das Iniciativas de Tecnologia da Informação | Contextualização acerca das iniciativas de TI, destacando suas principais fontes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ana Caroline      | Não se aplica |
|                                                            | Exposição das situações das iniciativas de TI, relacionadas na planilha SEI nº 0002514305.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ana Caroline      | Não se aplica |
| Monitoramento das Contratações de TI                       | Apresentação dos andamentos das Contratações de TI, relacionadas na Planilha Mapa de Acompanhamento de Contratações (0002515207).                                                                                                                                                                                                                                                       | Ana Caroline      | Não se aplica |
|                                                            | O Chefe da SEAU informou que a unidade está avaliando a conveniência da renovação do contrato de suporte do GLPI, em razão das deficiências constatadas no serviço atualmente prestado.<br><br>Relatou também que os totens interativos foram entregues, contudo os requisitos da contratação não foram integralmente cumpridos, tendo a empresa se comprometido a sanar as pendências. | Etevaldo Custódio | Não se aplica |
| Outras Informações                                         | Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.                                                                                                                                                                                                                                                   | Anderson Lima     | Não se aplica |

#### ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Nome                   | Unidade Representada | Assinatura            |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Leonardo Moraes Júnior | GABSTI               | Assinatura Eletrônica |

|                                |        |                       |
|--------------------------------|--------|-----------------------|
| Paulo das Neves e Silva Júnior | CODIN  | Assinatura Eletrônica |
| Etevaldo Cândido Custódio      | COSUT  | Assinatura Eletrônica |
| Ana Caroline Carvalho Portela  | GABSTI | Assinatura Eletrônica |

Em 19 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Etevaldo Candido Custodio, Coordenador(a), em exercício**, em 25/09/2025, às 09:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 25/09/2025, às 11:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 24/10/2025, às 10:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo das Neves e Silva Junior, Chefe de Seção**, em 24/10/2025, às 10:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002514271** e o código CRC **CEB85A00**.

0013518-35.2025.6.18.8000

0002514271v10



--

# Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

---

Reunião – SEI nº 0013518-35.2025.6.18.8000

18 de setembro de 2025



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí

1. Iniciativas de Tecnologia da Informação
2. Acompanhamento das contratações de Tecnologia da Informação

# Iniciativas de TI

---

## Contextualização


Principais fontes de iniciativas:

1. Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2. Planos de ação e projetos
3. iGovTIC-JUD
4. OKRs
5. Auditorias

# Iniciativas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação

## Contextualização

- 68 iniciativas
- 60 iniciativas concluídas
- 6 iniciativas em andamento
- 2 não iniciadas

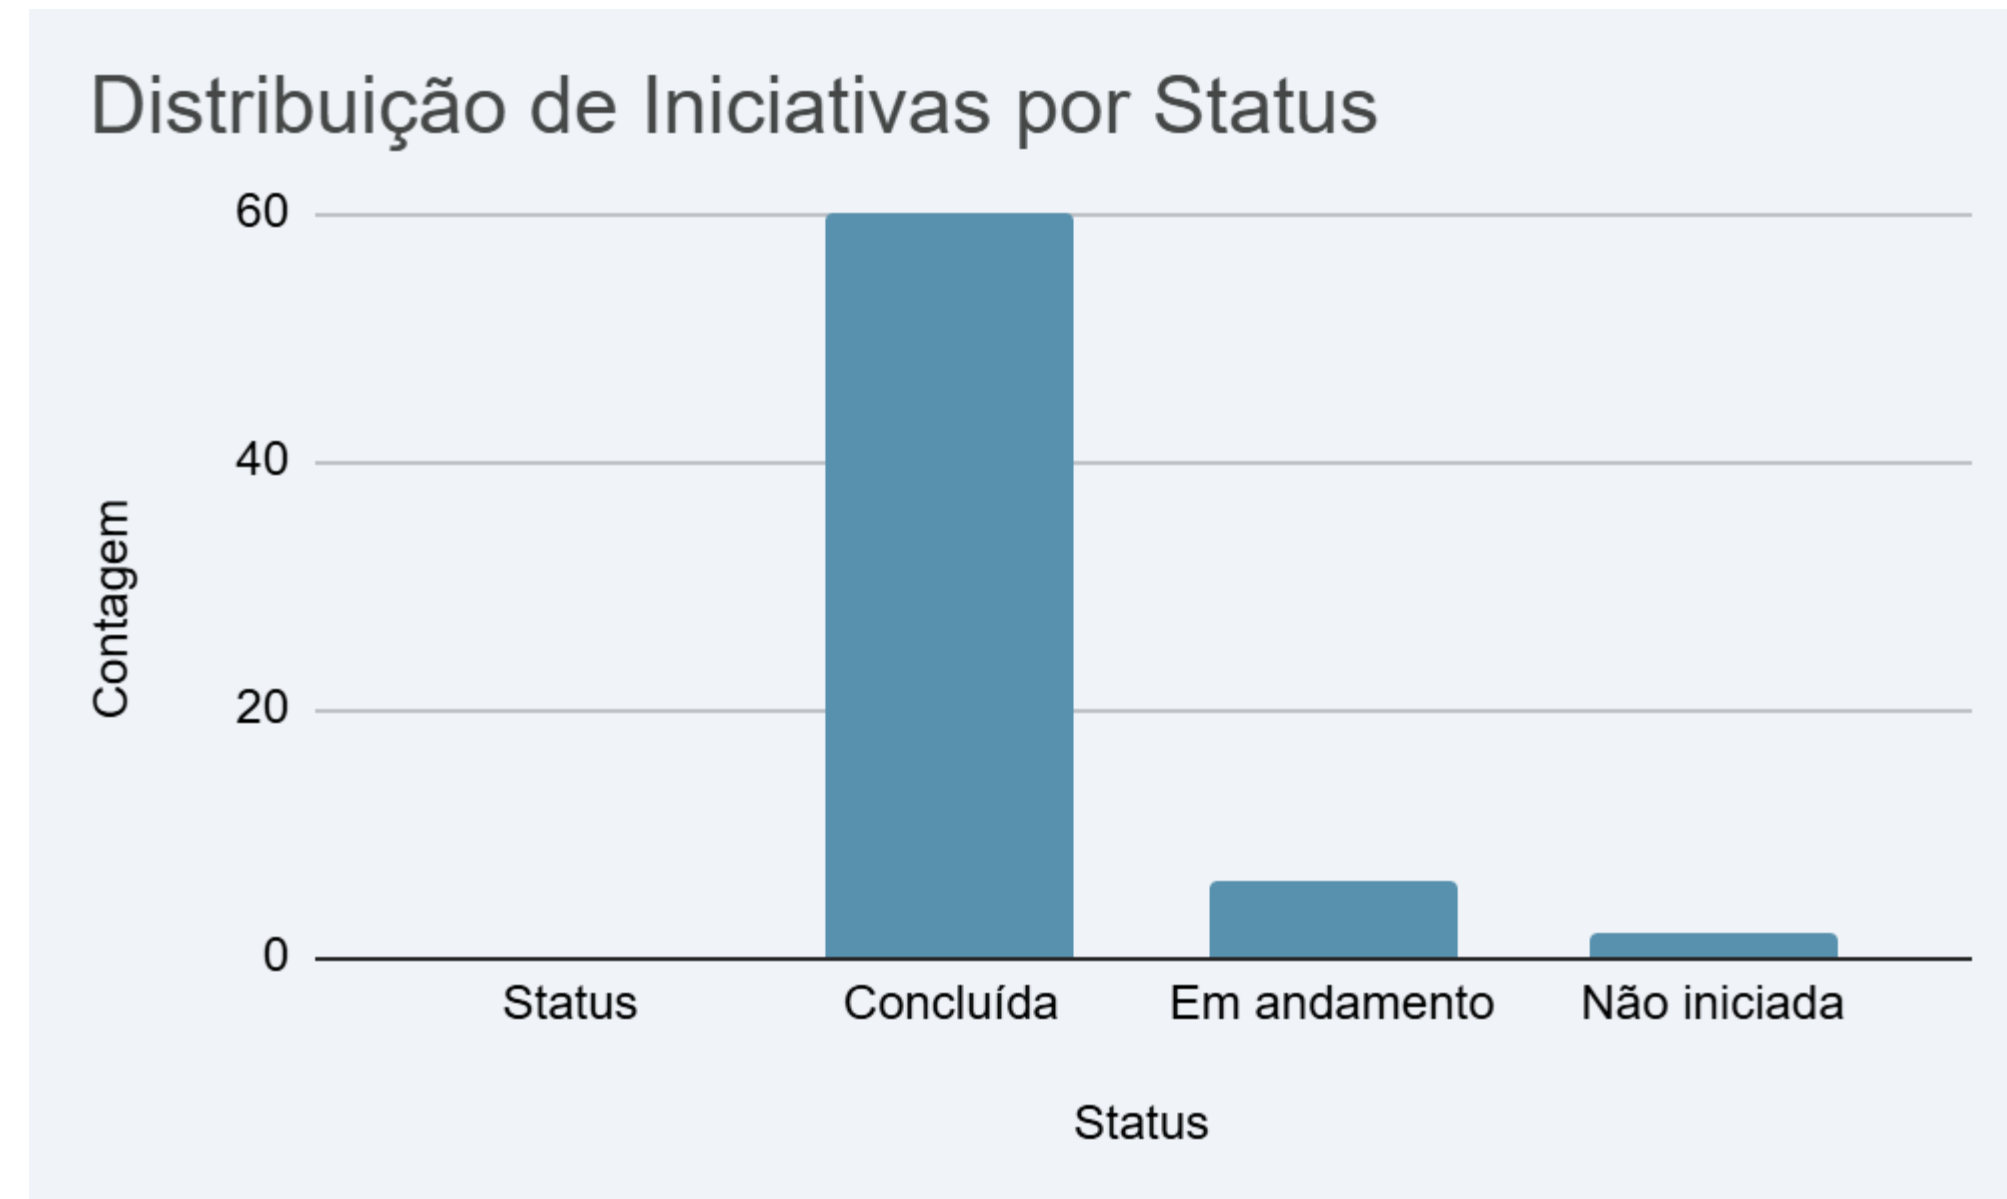

[Abrir Planilha](#)

# Iniciativas OKR

---

## Contextualização

- SEI nº 0011522-02.2025.6.18.8000
- Quatro iniciativas apontadas

[Abrir Planilha](#)


# Iniciativas iGovTIC-JUD

## Contextualização

- Processo SEI nº 0011314-18.2025.6.18.8000
- 43 iniciativas relacionadas

[Abrir Planilha](#)

Distribuição de Iniciativas por Unidade

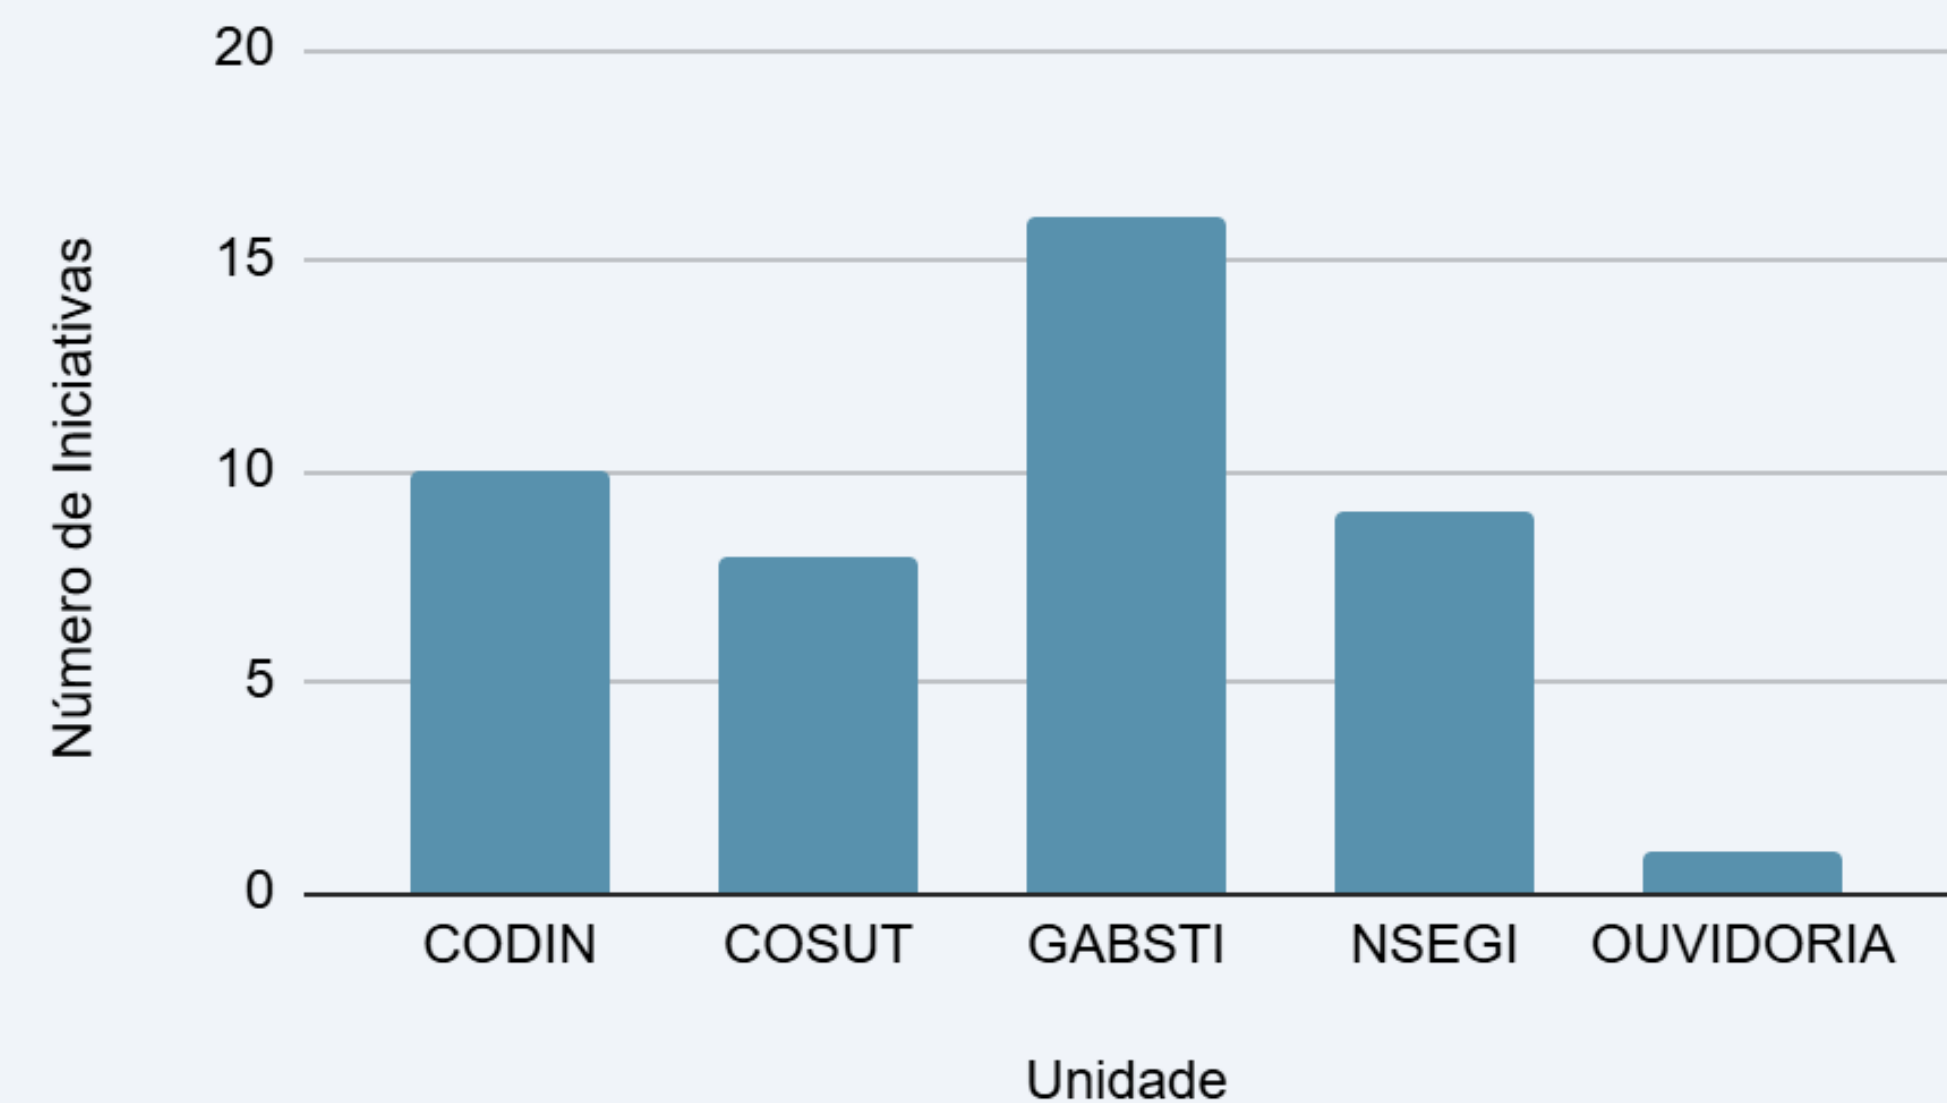

# Acompanhamento das Contratações de TI 2025

---

## Contextualização

- Plano de Contratações de TI instituído pela Portaria Presidência nº 556/2024
- Relação de 30 contratações
- 40 contratações em acompanhamento

[Abrir Planilha](#)

---

Secretaria de Tecnologia da Informação  
[sti@tre-pi.jus.br](mailto:sti@tre-pi.jus.br)  
(86) 2107-9760



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí



## Planejamento Iniciativas iGovTIC-JUD

| ID | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Item do Manual iGovTIC-JUD 2025 | Plano de ação?            | Data início | Data fim   | Unidade   | Status       | Observações                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Revisão Processo de Gerenciamento de Projetos de TI                                                                                                                                                                                                 | Item 2.2                        | 0009444-35.2025.6.18.8000 | 15/07/2025  | 26/09/2025 | GABSTI    | Em andamento |                                                                                   |
| 6  | Revisão do Processo de Gerenciamento de Contratos de TI                                                                                                                                                                                             | Item 2.3                        | não                       | 01/09/2025  | 19/12/2025 | COSUT     | Em andamento | Já foi realizada uma atualização em maio/25, mas será efetuada outra atualização. |
| 17 | Atualização Carta de Serviços                                                                                                                                                                                                                       | Item 10                         | não                       | 22/01/2025  | 15/12/2025 | OUVIDORIA | Em andamento |                                                                                   |
| 18 | Implementação de modelos de inteligência artificial (IA)                                                                                                                                                                                            | Item 13                         | SEI ???                   | 22/01/2025  | 15/12/2025 | CODIN     | Em andamento |                                                                                   |
| 19 | Capacitação dos atendentes da Central de Serviços                                                                                                                                                                                                   | Item 14                         | não                       | 18/08/2025  | 19/12/2025 | COSUT     | Em andamento | Processo SEI 0011959-43.2025.6.18.8000                                            |
| 21 | Monitoramento do SLA ou ANO da Central de Serviços                                                                                                                                                                                                  | Item 14                         | não                       | 06/01/2015  | 19/12/2025 | COSUT     | Em andamento |                                                                                   |
| 26 | Realização de contratações de provedores de nuvem                                                                                                                                                                                                   | Item 19                         | não                       | 14/03/2025  | 30/10/2025 | CODIN     | Em andamento | Processo SEI 0015280-23.2024.6.18.8000                                            |
| 27 | Sobre a prestação de serviços em nuvem                                                                                                                                                                                                              | Item 20                         | não                       | 14/03/2025  | 14/03/2025 | CODIN     | Em andamento |                                                                                   |
| 28 | Monitorar execução do processo de gerenciamento de serviços de TI                                                                                                                                                                                   | Item 21                         | não                       | 06/01/2015  | 19/12/2025 | COSUT     | Em andamento |                                                                                   |
| 29 | Revisar o processo de gerenciamento de serviços de TI                                                                                                                                                                                               | Item 21                         | não                       | 23/04/2025  | 10/10/2025 | COSUT     | Em andamento |                                                                                   |
| 32 | Manter periodicidade trimestral da Comissão de Segurança da Informação                                                                                                                                                                              | Item 22                         | não                       | 03/07/2025  | 30/12/2025 | NSEGI     | Em andamento |                                                                                   |
| 33 | Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ nº 396/2021) ???? | Item 23.1                       |                           | 01/09/2025  | 27/02/2026 | NSEGI     | Em andamento |                                                                                   |
| 34 | O órgão implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os man                                                                                                                                                                 | Item 23.1                       | Sim. SEI ???              | 01/09/2025  | 27/02/2026 | NSEGI     | Em andamento |                                                                                   |
| 36 | Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TI                                                                                                                                                                                                          | Item 24                         | não                       | 01/09/2025  | 10/10/2025 | NSEGI     | Em andamento |                                                                                   |
| 37 | Monitorar execução da Política de Segurança da Informação                                                                                                                                                                                           | Item 25                         | não                       | 03/11/2025  | 14/11/2025 | NSEGI     | Em andamento |                                                                                   |
| 41 | Revisar o processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas                                                                                                                                                                                     | Item 27                         | não                       | 15/09/2025  | 28/11/2025 | CODIN     | Em andamento |                                                                                   |
| 42 | Atualização de Portfólio de Soluções de TI                                                                                                                                                                                                          | Item 28                         | não                       |             |            | CODIN     | Em andamento | Em atualização pela CODIN.                                                        |

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI  
SETEMBRO DE 2025

| ITEM | INICIATIVA                                          | ÁREA   | VALORORCAM | SIT              | DATADOD    | DATAEQUIPE | DATAETP    | DATAPAREC  | DATAEDITAL | DATAPREGÃO | DATALICIT  | DATAHOMOL  | DATACONT   | DATAOS/OF  | DATAACEITE | DATAPAGO   | ÚMEROCONTRA       | DATAVENCTO                                  | OBSERVAÇÃO                                                                             | 1 |
|------|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4    | COMUNICAÇÃO DE DADOS INTERIOR                       | CODIN  | 562000     | CONCLUÍDA        | 22/04/2020 | 11/05/2020 | 25/06/2021 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 10/08/2021 | 19/08/2021 |            |            | 21CT0029          | 23/08/2026                                  | Prorrogação: 0001988129Upgrade: 0002440813                                             |   |
| 5    | COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA                | CODIN  | 70000      | INICIADA         | 17/09/2025 | 26/09/2025 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 |            |            | 21CT0004          | 01/02/2026                                  | Valido até 02.2026. DOD em elaboração.                                                 |   |
| 8    | LICENCIAMENTO IDE                                   | CODIN  | 71800      | TRAMITANDO       | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 | 10/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 |            |            | 24CT0006          | 12/11/2025                                  | PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO. DOD está tramitando.                                     |   |
| 9    | LICENCIAMENTO PLUGIN IA IDE                         | CODIN  | 26400      | TRAMITANDO       | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 | 10/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 |            |            | 24CT0006          | 12/11/2025                                  | PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO                                                           |   |
| 10   | MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEIT             | CODIN  | 253500     | CONCLUÍDA        | 16/06/2021 | 25/06/2021 | 15/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 19/11/2021 | 25/11/2021 | 01/12/2021 |            |            | 21CT0045          | 12/08/2026                                  | Renovado até 12/08/2026Prorrogação: 0002447054                                         |   |
| 14   | MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA E TRANSPALETE            | COELEI | 13200      | ESTUDOS          | 30/07/2025 | 05/08/2025 | 01/09/2025 |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 23CT0027          | 20/09/2025                                  | RENOVAR CONTRATAÇÃO SEI 0010813-64.2025.6.18.8000 - ETP em elaboração                  |   |
| 15   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS COELEI   |        | 294580     | CONCLUÍDA        | 14/06/2024 | -          | 06/08/2024 | 22/08/2024 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | -          | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 26/12/2024 | -          | -          | 24CT0063          | 18/12/2029                                  |                                                                                        |   |
| 33   | SUPORTE GLPI                                        | COSUT  | 23200      | AGUARDANDO PR    | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 09/10/2025 | 23/10/2025 | 06/11/2025 | 13/11/2025 | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 |            |            | 23CT0001          | 11/01/2025                                  | PLANEJAR A RENOVAÇÃO ESTE ANO                                                          |   |
| 34   | SUPORTE - AUDITORIA DE ARQUIVOS E E-MAIL            | NSCIB  | 54000      | AGUARDANDO PRAZO |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |                                             | PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO                                                           |   |
| 35   | SOFTWARE DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES              | NSCIB  | 0          | TRAMITANDO       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |                                             | PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO/ PROCESSO DE RENOVAÇÃO SENDO REALIZADO PELO TRE-PA        |   |
| 1    | DISCO RÍGIDO SSD PARA SERVIDORES                    | CODIN  | 100800     | ESTUDOS          | 24/03/2025 | 11/04/2025 | 16/09/2025 | 25/09/2025 | 16/08/2025 | 02/10/2025 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | 04/12/2025 | 08/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 2    | SWITCHS GERENCIÁVEIS                                | CODIN  | 250000     | ESTUDOS          | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 26/07/2025 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 24/10/2025 | 07/11/2025 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 30/11/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 7    | EMISSÃO DE CERTIFICADOS SSL                         | CODIN  | 10000      | CONCLUÍDA        | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 20/06/2025 | 27/06/2025 |            | 04/06/2025 |            |            | NOVO              | -                                           | USAR ARP BAHIA                                                                         |   |
| 17   | BATERIA PARA NO-BREAK                               | COSUT  | 50000      | ESTUDOS          | 22/08/2024 | 30/01/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 12/12/2025 | 19/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 18   | COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN            | COSUT  | 9700       | ESTUDOS          | 22/08/2024 | 30/01/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 20   | HUB USB 3.0                                         | COSUT  | 3000       | CONCLUÍDA        | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 20/10/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 22   | IMPRESSORAS LASER                                   | COSUT  | 93000      | TRAMITANDO       | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 23   | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS                         | COSUT  | 160000     | TRAMITANDO       | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 24   | MICROCOMPUTADORES                                   | COSUT  | 1061650    | CONCLUÍDA        | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 28/04/2025 | 02/06/2025 |            |            |            | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 17/2025    | -                 | AQUISIÇÃO COMO PARTICIPE ARP 19/2023 TRE-RR |                                                                                        |   |
| 26   | NOTEBOOKS                                           | COSUT  | 195000     | TRAMITANDO       | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 27   | SCANNER A3                                          | COSUT  | 30000      | TRAMITANDO       | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 28   | SCANNER DE PEQUENO PORTE                            | COSUT  | 55500      | TRAMITANDO       | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 32   | SOLUÇÃO DE OMNICHANNEL                              | COSUT  | 120000     | CONTRATADA       | 31/01/2024 | 16/05/2025 | 14/05/2024 | 16/06/2025 | 24/06/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 03/10/2024 | 21/07/2025 | 31/07/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 25CT0022          | 21/07/2026                                  | CONTRATAÇÃO COMO PARTICIPE DA ARP 62/2024 TRE-CE                                       |   |
| 36   | SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO ZERO TRUST                 | NSCIB  | 1350000    | TRAMITANDO       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | NOVO              | -                                           | CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO TSE. INFORMADO TRE-PI COMO PARTICIPE. ELABORANDO TR         |   |
| 3    | VIDEOWALL                                           | CODIN  | 150000     | CONCLUÍDA        | 31/01/2024 | 22/02/2024 | 11/03/2024 | 11/10/2024 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 24/12/2024 | 14/05/2025 | 20/05/2025 |            |            | NOVO              | -                                           |                                                                                        |   |
| 6    | COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIO             | CODIN  | 257400     | CONCLUÍDA        | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 10/01/2025 | 23/01/2025 | 21/02/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 |            |            | 08/2025 e 09/2025 |                                             | VALOR CONTRATADO R\$ 368.508,00                                                        |   |
| 21   | IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS                      | COSUT  | 34200      | CONCLUÍDA        | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 19/02/2024 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 02/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | ARP 33/2024       | 04/09/25                                    | EQUIPAMENTOS RECEBIDOS                                                                 |   |
| 25   | MOLDURA INTERATIVA                                  | COSUT  | 1800       | CONCLUÍDA        | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 19/02/2024 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 02/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 18/06/2025 | 27/06/2025 | ARP 35/2024       | 13/09/2025                                  | EQUIPAMENTOS RECEBIDOS                                                                 |   |
| 29   | TOTEM INTERATIVO                                    | COSUT  | 19800      | CONTRATADA       | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 19/02/2024 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 02/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | ARP 34/2024       | 04/09/2025                                  | AGUARDANDO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS                                                    |   |
| 31   | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3                 | COSUT  | 18300      | CONCLUÍDA        | 18/04/2024 |            |            |            | 24/07/2024 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 15/08/2024 | 03/09/2024 | 22/04/2025 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 126 e 127/2024    | 28/08/2025                                  | PLANEJAR AQUISIÇÃO DESTE ANO                                                           |   |
| 11   | SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM                  | CODIN  | 160000     | TRAMITANDO       | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 19/09/2025 | NOVO              | -                                           | Diligência                                                                             |   |
| 13   | SUPORTE TÉCNICO OPENSIFT REDHAT                     | CODIN  | 168500     | CONTRATADA       | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 14/09/2023 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 28/11/2024 | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 28/06/2024 | 16/07/2024 | 24CT0009          | 17/03/2027                                  | ACOMPANHAR EMPENHO DESTE ANO                                                           |   |
| 16   | SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS ( COELEI |        | 249800     | NÃO INICIADA     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO - SEM PREVISÃO DE CONTATAÇÃO                                          |   |
| 37   | SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS E LGPD                  | NSCIB  | 1250000    | TRAMITANDO       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | NOVO              | -                                           | TSE na fase de publicação de IRP. EDITAL PUBLICADO PREGAO 90018/2025. LIASG 70001      |   |
| 38   | SOLUÇÃO DE PREVENÇÃO DE PERDA DE DADOS (DLI         | NSCIB  | 1400000    | NÃO INICIADA     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | NOVO              | -                                           | NOVA CONTRATAÇÃO                                                                       |   |
| 39   | PLATAFORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇ/ NSEGI    |        | 52000      | INICIADA         | 14/08/2025 |            |            |            |            | 11/07/2025 |            | 30/07/2025 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 33/2025           | 11/09/2028                                  | Reclassificação de despesa gerou atraso. Solicitado adiamento da vigência por 15 dias. |   |
| 12   | SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA                         | CODIN  | 25000      | CONCLUÍDA        | 24/02/2025 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 14/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 20CT0036          | 25/08/2025                                  | Diligência                                                                             |   |
| 19   | HEADSET                                             | COSUT  | 9300       | CONCLUÍDA        | 29/01/2024 | 01/02/2024 | 28/03/2025 | 23/04/2025 |            |            |            | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 05/05/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | NOVO              | -                                           | ADESÃO À ARP 01/2025 UFPE                                                              |   |
| 30   | WEBCAM                                              | COSUT  | 5600       | CONCLUÍDA        | 29/01/2024 | 01/02/2024 | 28/03/2025 | 23/04/2025 |            |            |            | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 29/04/2025 | 13/06/2025 | 26/06/2025 | NOVO              | -                                           | ADESÃO À ARP 123/2024 UFC                                                              |   |
| 31   | MICROCOMPUTADORES                                   | COSUT  | 187350     | CONTRATADA       | 23/08/2024 | 28/01/2025 | 28/04/2025 | 02/06/2025 |            |            |            |            | 05/09/2025 | 09/09/2025 | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 32/2025           | -                                           | AQUISIÇÃO COMO PARTICIPE ARP 19/2023 TRE-RR                                            |   |

Célula: E5  
Comentário: Número do Item no  
Plano de Contratações de Soluções de TI do ano

Célula: F5  
Comentário: Valor do Item no  
Plano de Contratações de Soluções de TI

Célula: G5  
Comentário: Número do Item no  
Plano Anual de Contratações (SAOF)

Célula: H5  
Comentário: Plano Anual de  
Contratações (SAOF)

Célula: I5  
Comentário: Orçamento
